



**PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

RN 147 DÉVIATION DE LUSSAC-LES-CHÂTEAUX

Visite officielle – Lancement des travaux

19 janvier 2023

29, lieu-dit Chantegros, Lussac- les-Châteaux

Historique

23 avril 2019 : DUP


2020-2021 :

- Lancement des phases :

Études d'avant projet
Demande d'autorisation environnementale
Enquête parcellaire.

- Inscription au CPER : 143 M€

État	50,05 M€
Région	40,04 M€
Département	52,91 M€

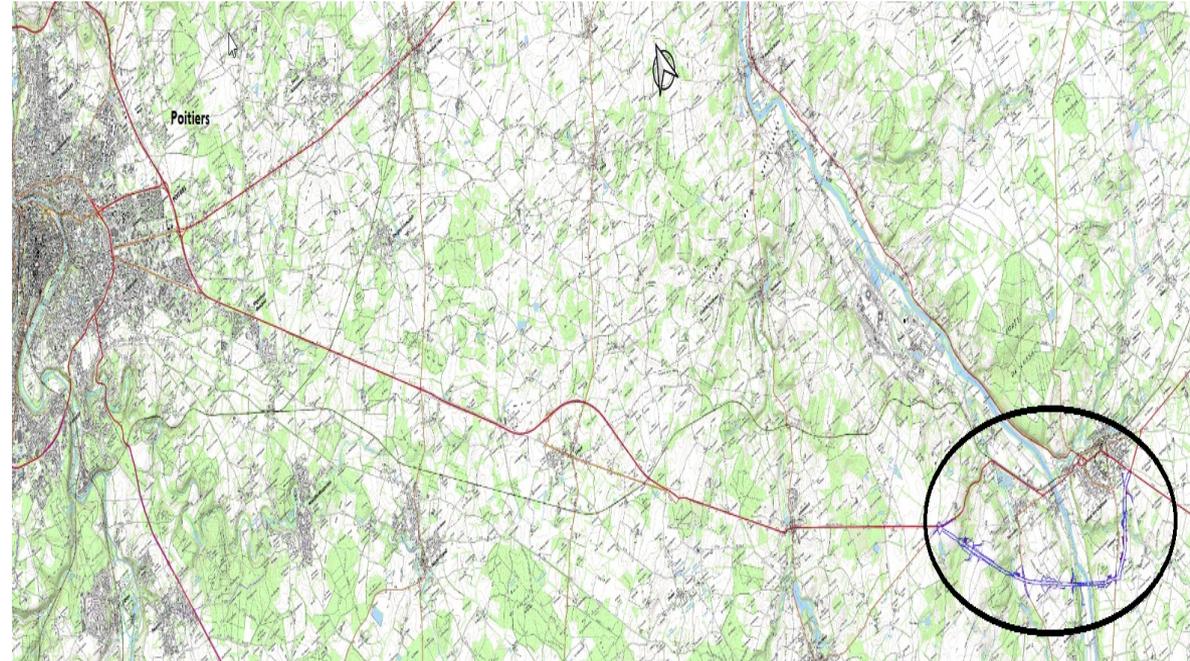



Comité de pilotage du 06/07/2022

Conclusions

- Organisation de la communication durant la vie de l'opération.
- Lancement des travaux en mosaïque fin 2022 sous réserve de:
 - l'obtention de l'Autorisation Environnementale unique;
 - la maîtrise foncière ;
 - la découverte des enjeux archéologiques


Avancement au 19 janvier 2023

- **Organisation de la communication durant la vie de l'opération.**
 - Plan de communication
 - Lettre infochantier n°1
- **Autorisation environnementale unique;**
 - Enquête loi sur l'eau du 22/08 au 23/09/2022
 - Avis favorable du CODERST le 08/12/2022
 - Arrêté préfectoral d'autorisation le 16 décembre 2022

Avancement au 19 janvier 2023

- **Maîtrise foncière;**
 - Pour la partie sous aménagement foncier (57 ha) :
Avis favorable CDAF le 1 décembre 2022,
Signature arrêté préfectoral prise de possession anticipée ce jour;
 - Pour la partie hors AFAFE (25 ha) :
Signature convention tripartite acquisition carrière CMGO (10ha)
Accord de principe pour quelques promesses de vente
Arrêté de cessibilité en cours de préparation
 - Pour les mesures compensatoires (84,3 ha pour 61,5 ha engagement) :
8 sites de compensation
Signature des obligations réelles environnementales Chantegros
Préparation ORE Haras Terre de liens


Maîtrise foncière du 19 janvier 2023

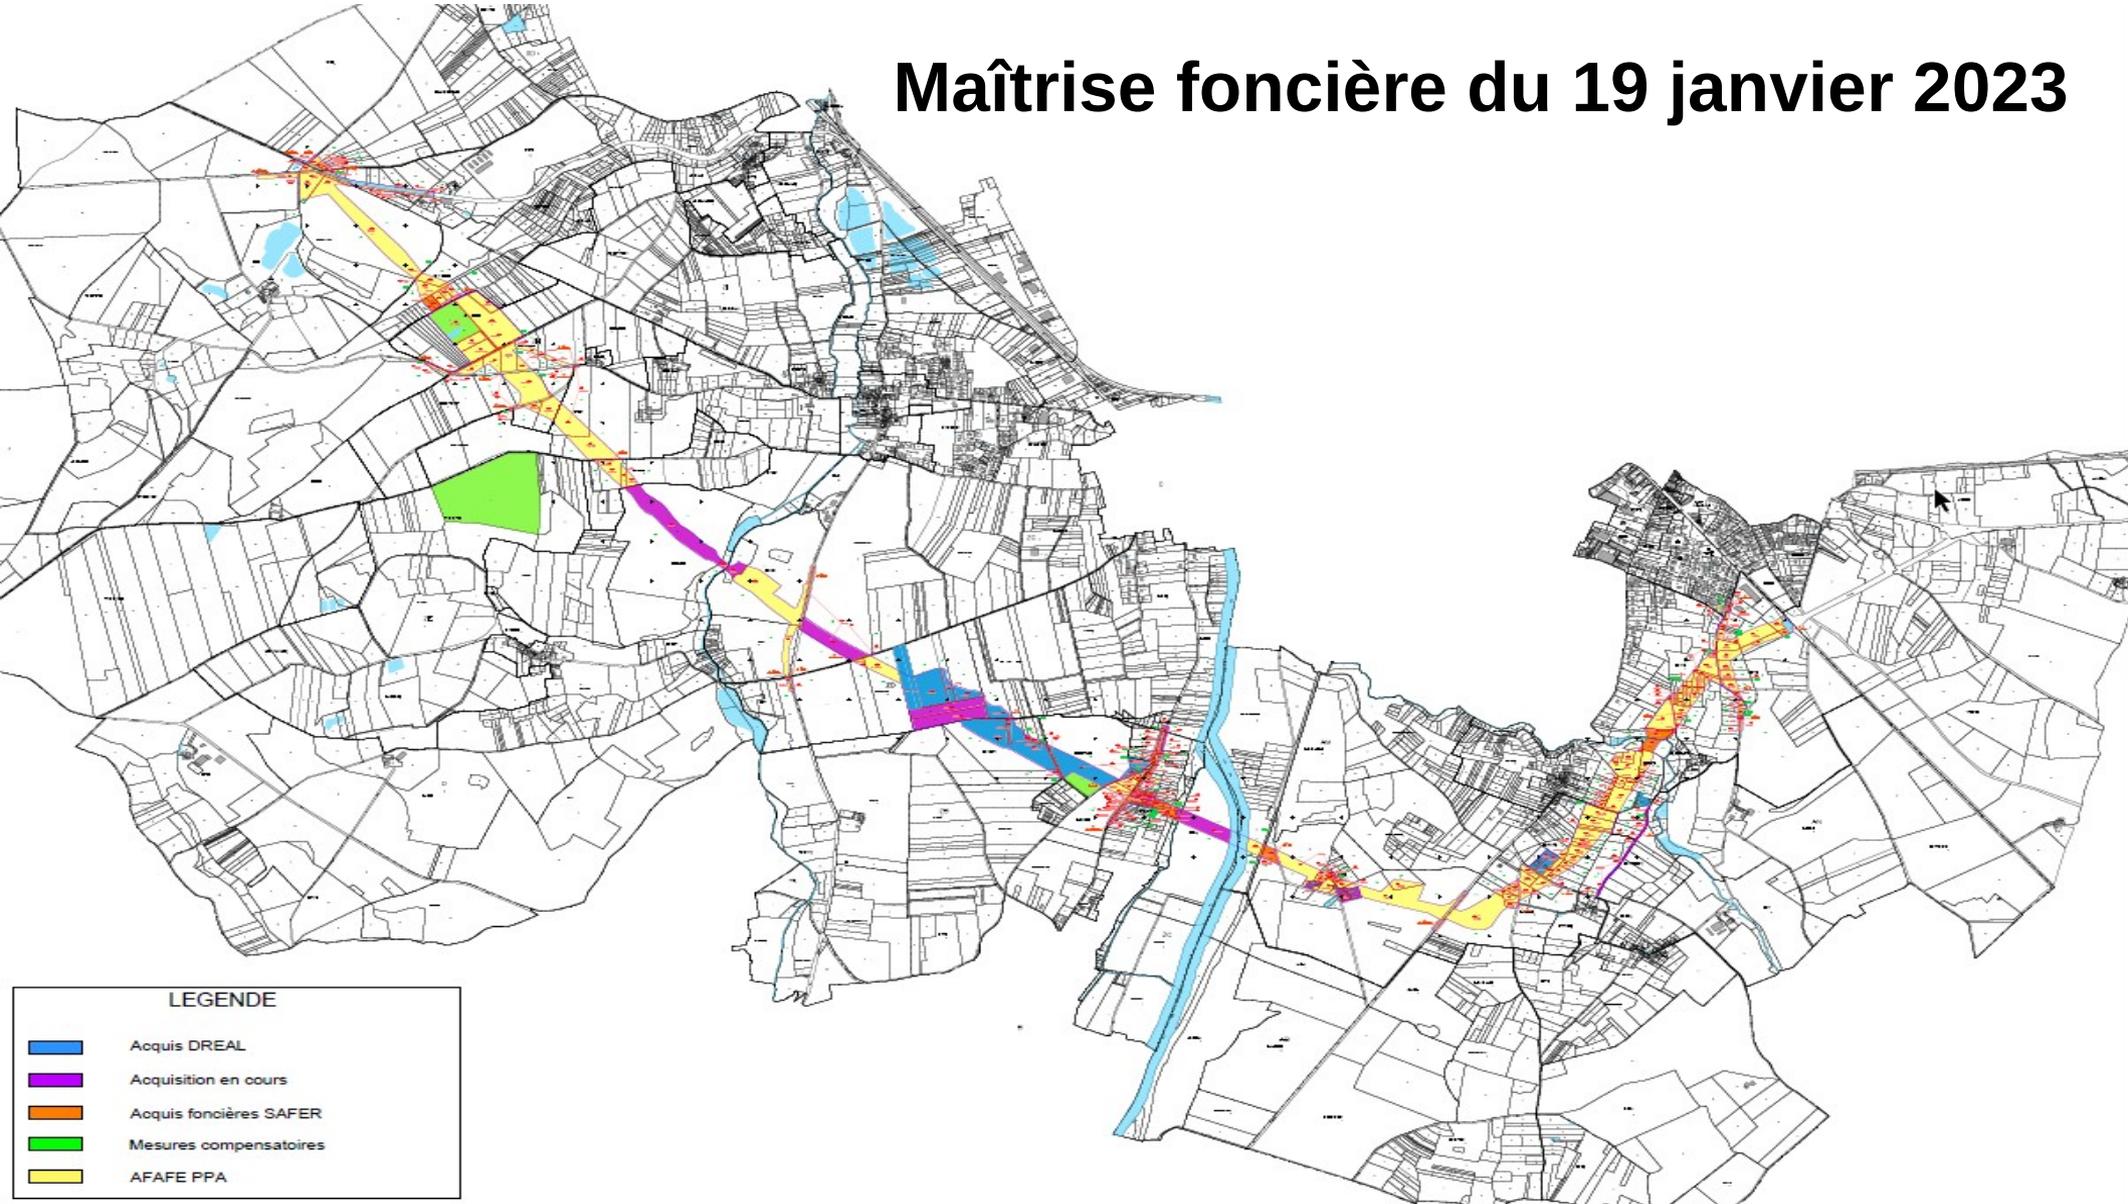


LEGENDE

- Acquis DREAL
- Acquisition en cours
- Acquis foncières SAFER
- Mesures compensatoires
- AFAFE PPA

Mesures Compensatoires

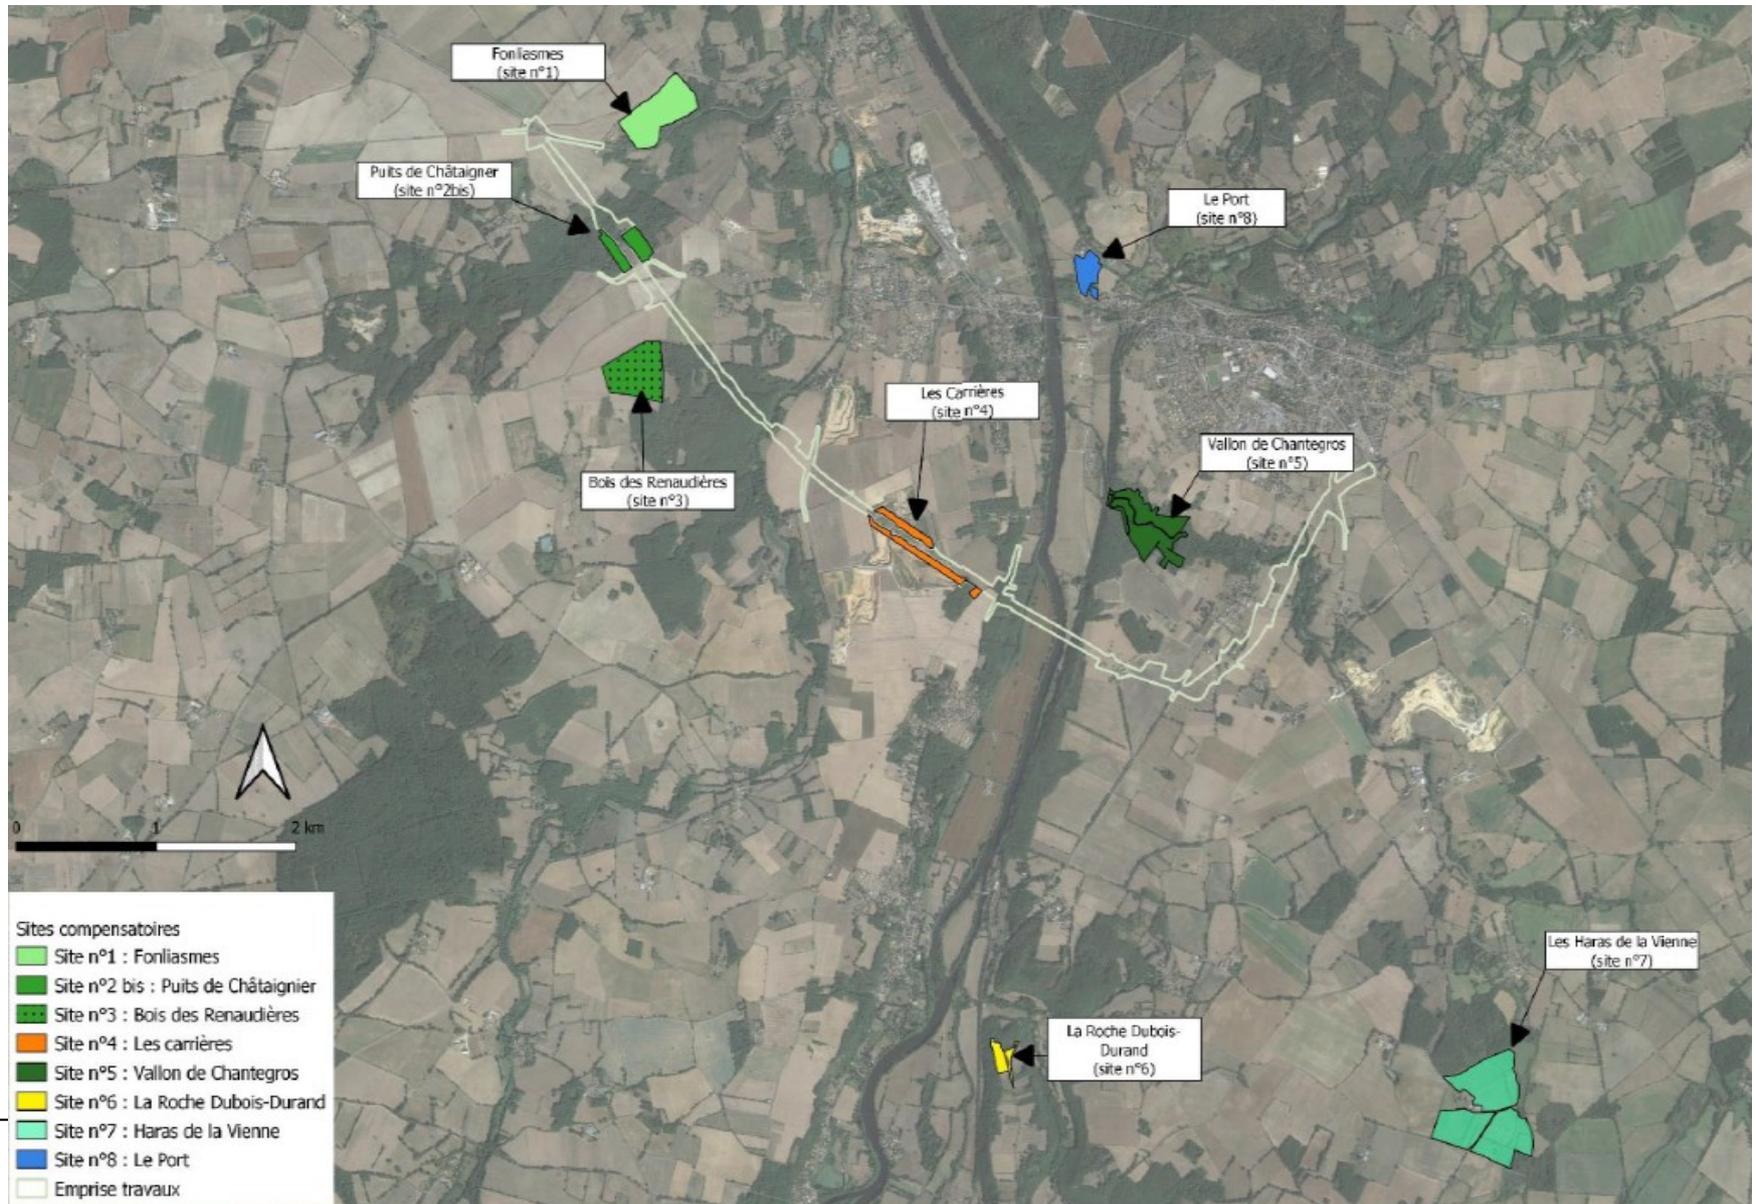

- **De la découverte des enjeux archéologiques**
 - Planification diagnostic archéologique avec la DRAC

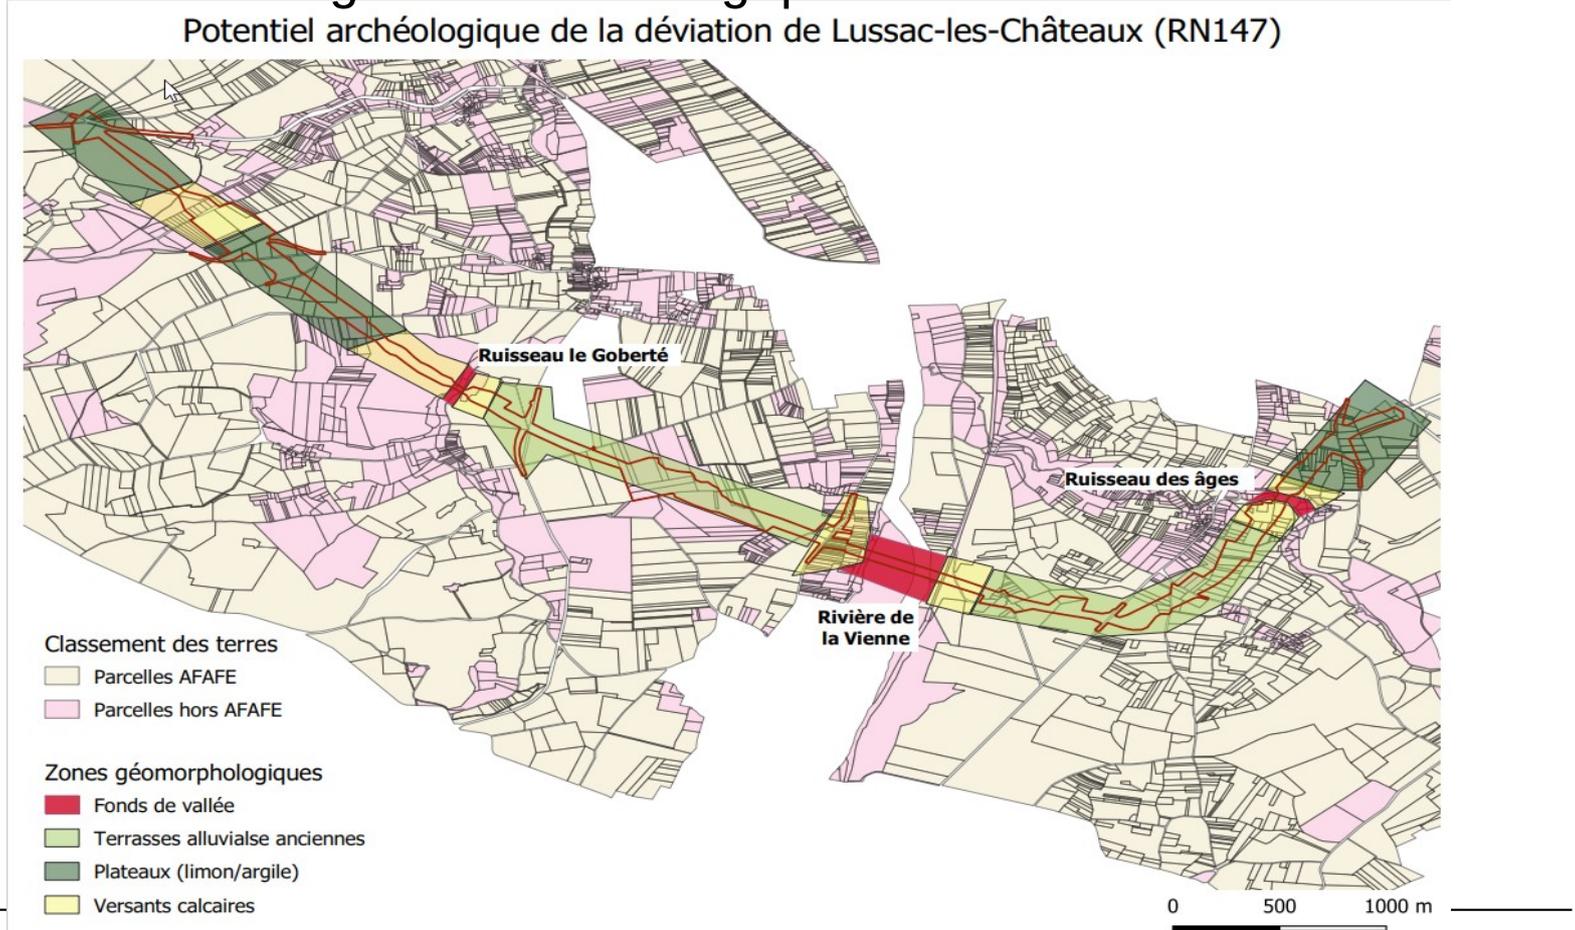


Programmation Travaux


2023 Trimestre 1

Déboisement
vallée des Âges

 Clôtures Est

Démolitions
- Maison (Chantegros) &
Hangar

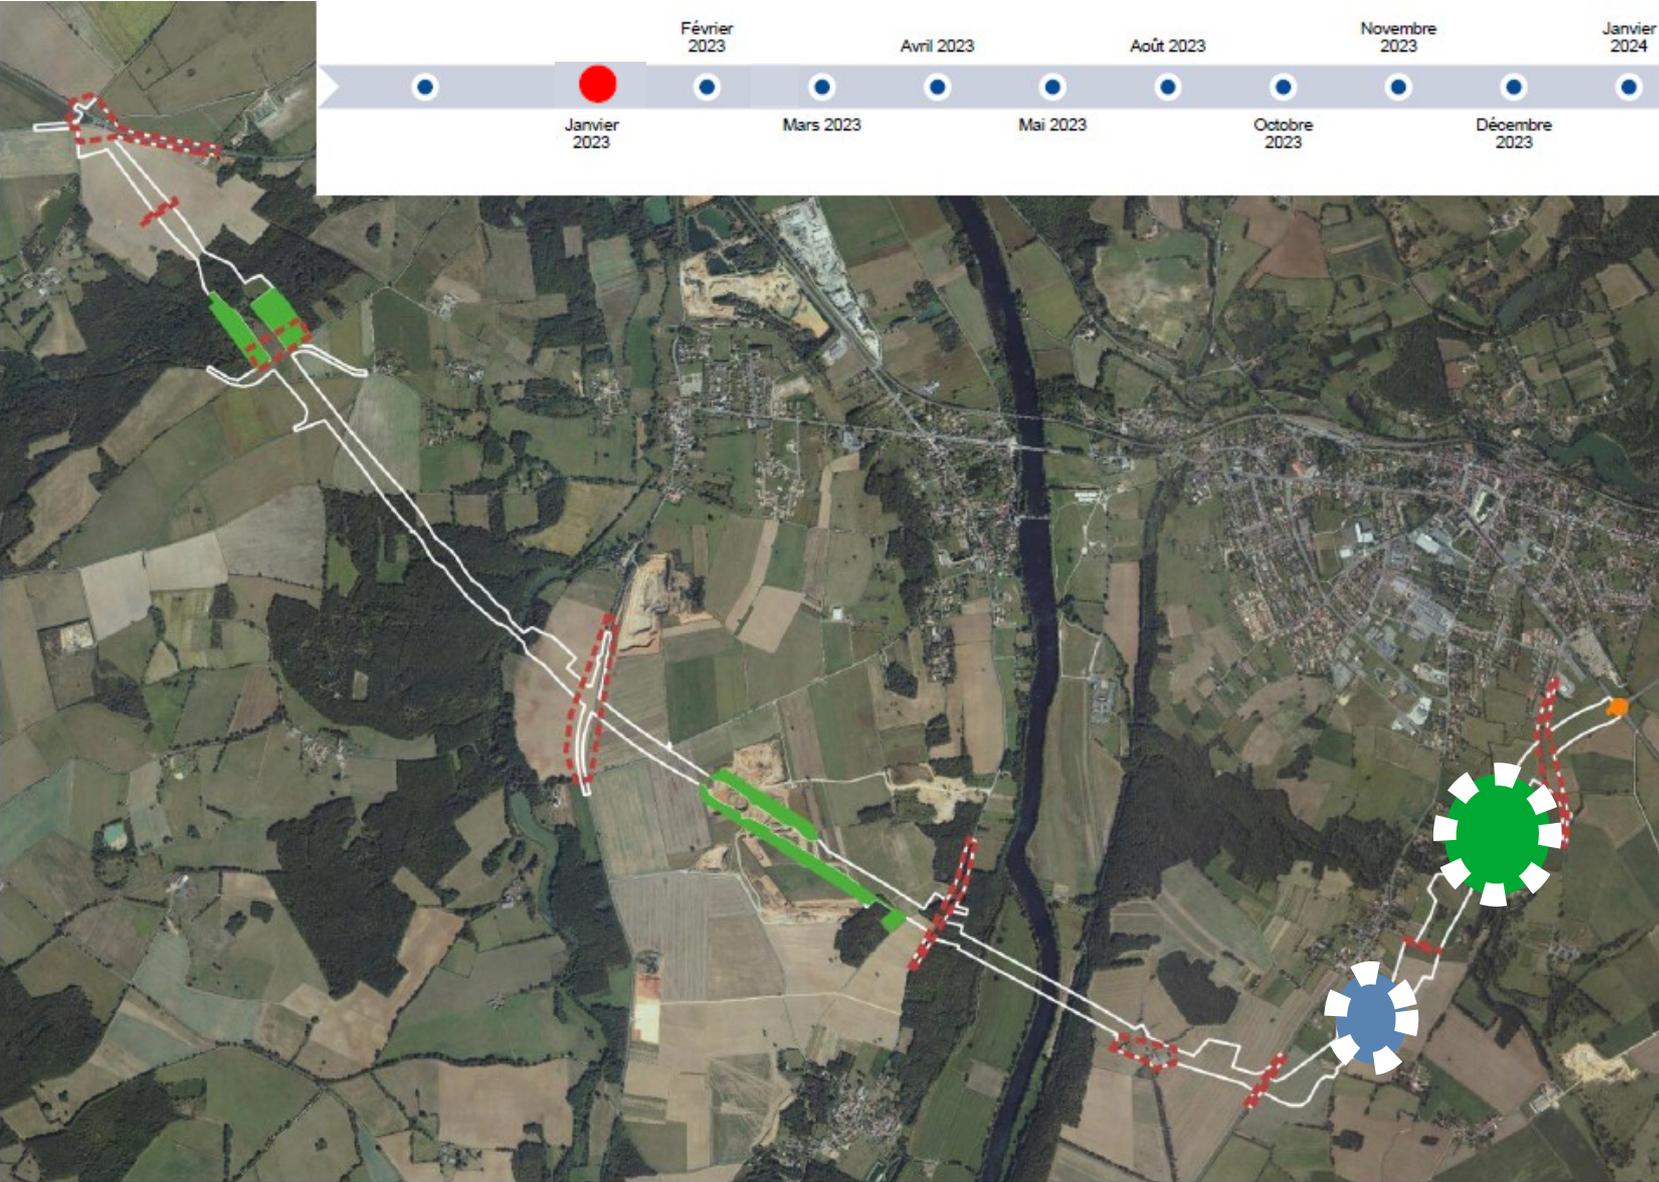

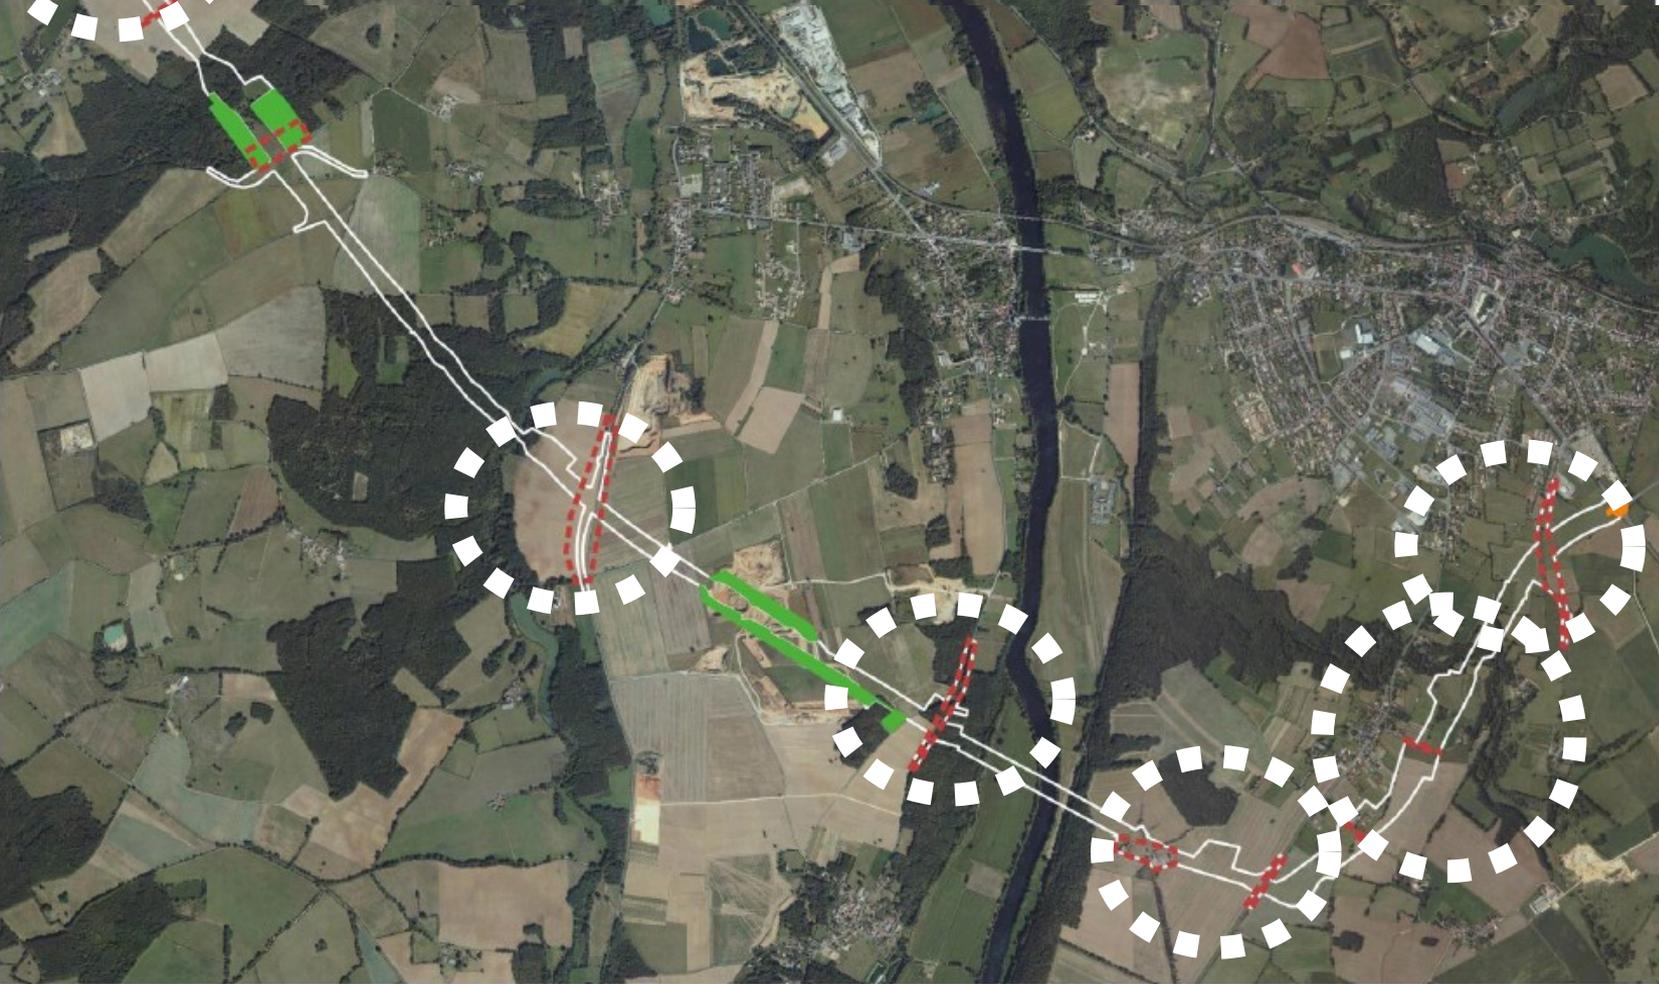


Programmation Travaux

2023 Trimestre 2

 Clôtures - suite

 Déplacement Réseaux

Diagnostics Archéologiques 1 - (zone des âges)





Programmation Travaux

2023 Trimestre 2

-  Clôtures
-  Réseaux existants
-  Mesures compensatoires



Programmation Travaux

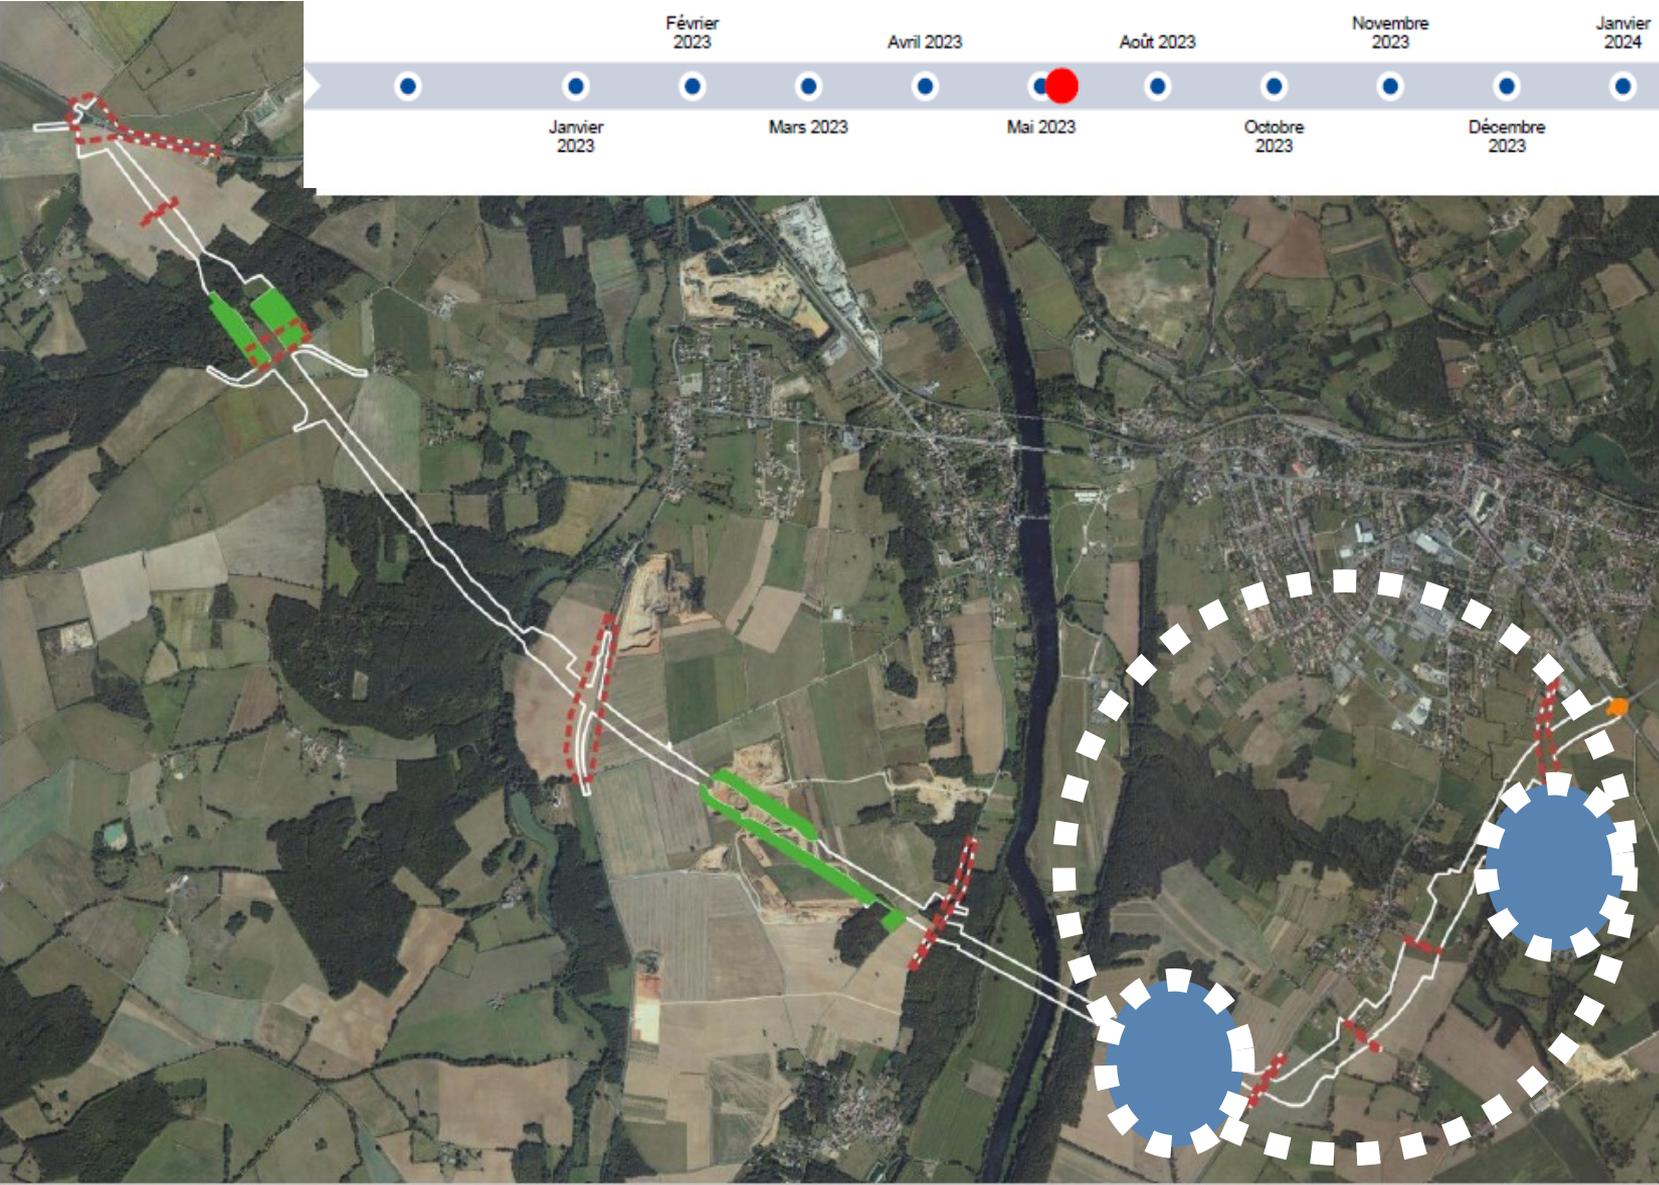

2023 Trimestre 2

-  Clôtures
-  Réseaux existants
-  Mesures compensatoires


Diagnosics
Archéologiques 1 - suite
(parcelles agricoles est)

Démolitions
- Ferme à Mauvillant
- Maison de M. Auzennet




Programmation Travaux

2023 Trimestre 3

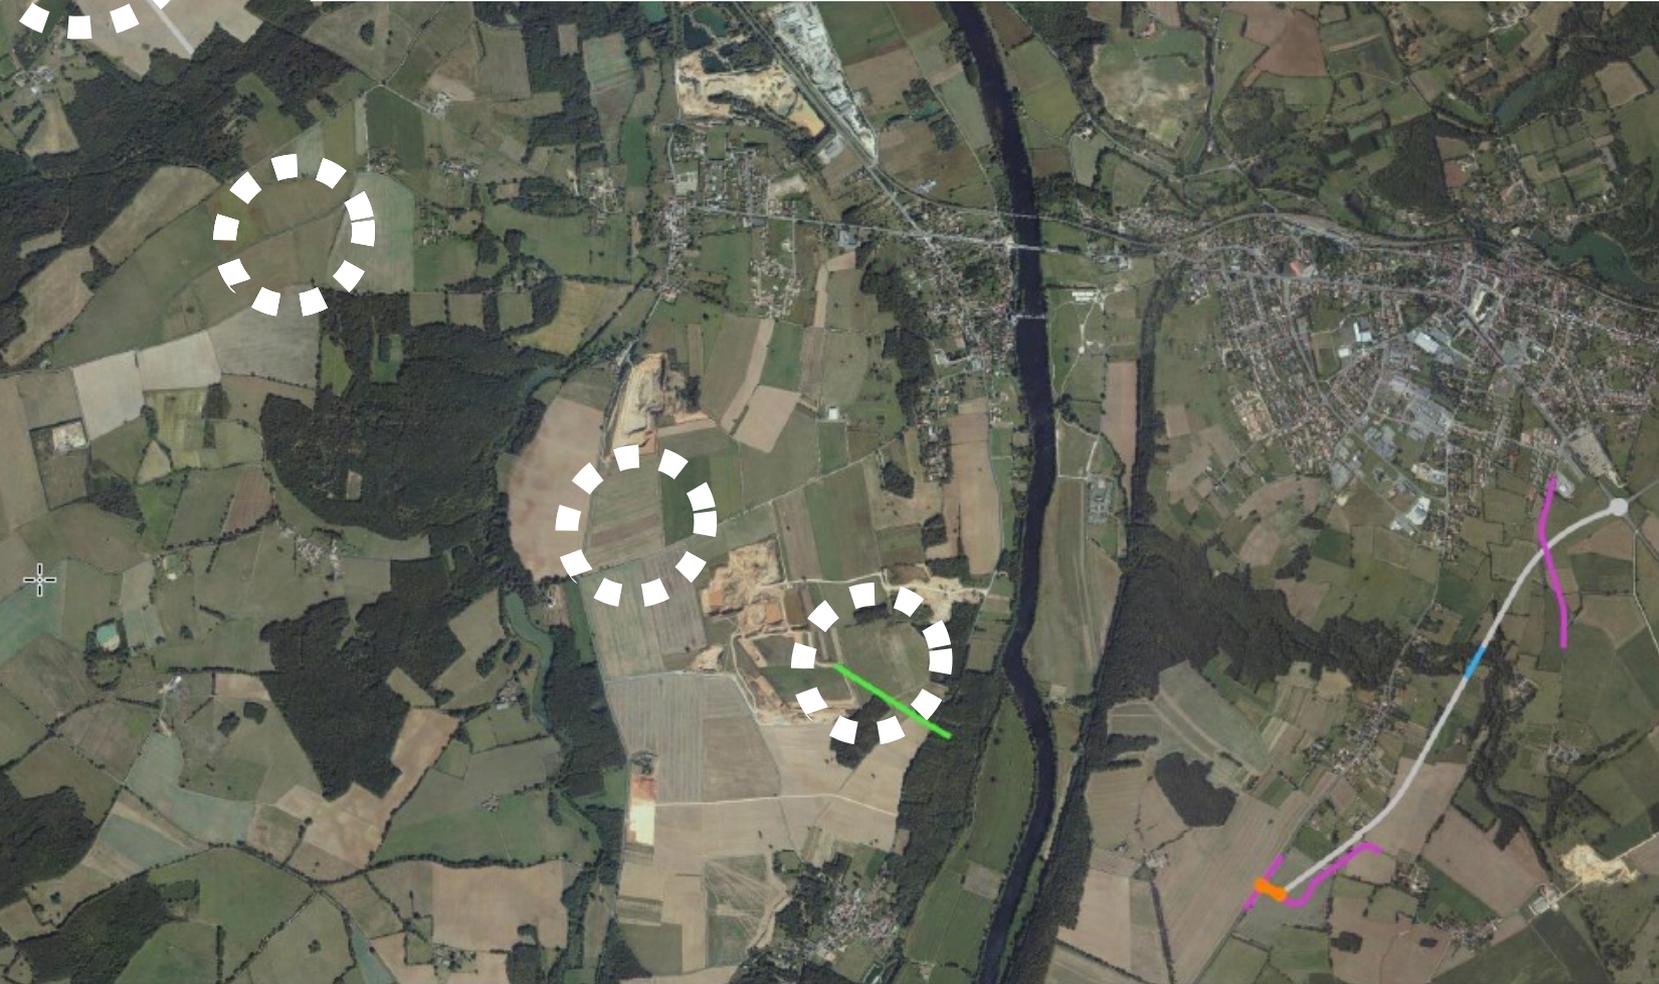

Diagnostics archéologiques -suite

Programmation Travaux



2023 Trimestre 4

Déboisement
vallée de la Vienne
vallée du Goberté
Aubergère

Diagnostics
Archéologiques - Fin

Sous-réserve contraintes
archéologiques, travaux
viaduc des âges, Giratoire
RD11 et rétablissement
Failloserie et Aire de
contrôle PL sur fin 2023.

Sous-réserve contraintes
archéologiques, viaducs,
ouvrages d'art et
rétablissements sur 2024





**PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Merci de votre attention
