



**Dépôt SIGAP OUEST de Niort**  
**Présentation du bilan sécurité 2014/2015**

**Réunion CSS du 14 mars 2016**

# Activité du dépôt de Niort



## ■ Activité du dépôt de Niort : Dépôt vrac de GPL

Dépôt de Niort : Stockage de 650 m<sup>3</sup> / Activité d'environ 20 KT

### Réception



Déchargement  
Camion-citerne  
gros porteur

### Stockage



Relais logistique

### Distribution



Chargement  
Camion  
Petit-porteur

#### Client final Vrac



- Particuliers,
- Collectivités,
- Industriels


RG- 0412- 2

# Activité du dépôt de Niort



## ■ Activité du dépôt de Niort : Dépôt vrac de GPL

*Dépôt de Niort : Stockage de 650 m<sup>3</sup> / Activité d'environ 20 KT*

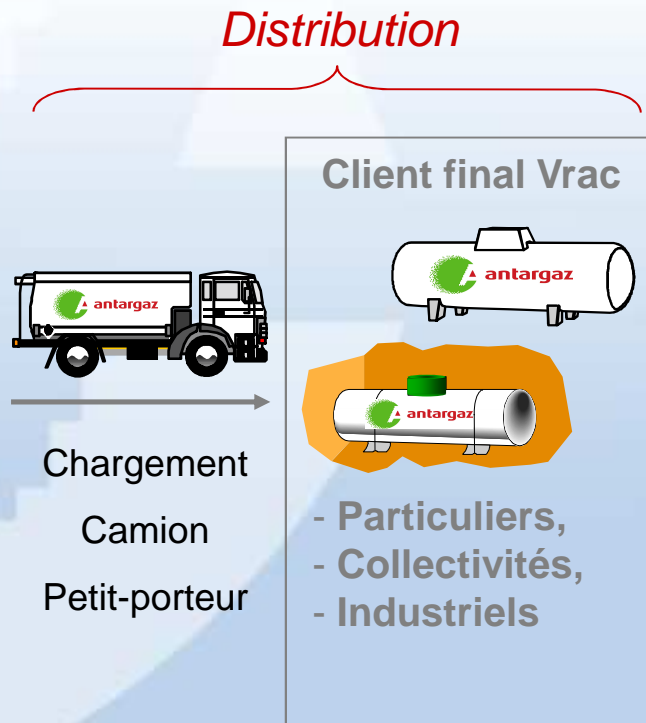

### Clientèle :

4700 clients (Données Antargaz) dont :

~ 3600 particuliers

~ 450 clients sensibles :

- Hôpitaux, cabinets médicaux
- Hospices
- Avicultures et élevages divers

Départements : 17, 79, 85, 86

# STOCKAGE



- 2 Réservoirs aériens cylindriques 100 m<sup>3</sup>
- 1 Réservoir sous-talus 450 m<sup>3</sup>
- Stockage de Bouteilles GED 75 tonnes maximum

## ■ Formations réglementaires :

- ATEX
- POI
- Habilitation électrique
- Secouriste
- Equipements sous pressions
- Sécurité incendie
- Pompiste
- TMD



Le personnel est à jour  
de formation sur  
l'exercice 2014/2015

# Bilan du SGS : 2014/2015

- **Accidents :**

Aucun accident ou incident industriel


- **Exercices incendie mensuels :**

12 exercices de réalisés

- **Audit Interne Qualité / Sécurité :**

Réalisé le 09/06/2015

Aucun écart / Des pistes d'amélioration essentiellement documentaires.



# Principales actions réalisées pour la prévention des risques 2014/2015



- Installation d'un détecteur d'orages
- Rénovation de la réserve incendie / création d'une plateforme accès pompiers
- Mise en place de CISC ( fermeture automatique des clapets camions) au postes de transfert
- Mise en conformité foudre suivant nouvel arrêté ministériel

RG- 0412-7

# Projets futurs de réduction des risques



- Amélioration de la sûreté de l'établissement suite à l'audit.
  
- Amélioration des automatismes.
  
- Projet de réduction des risques dans le cadre du PPRT :
  - Réduction du diamètre des tuyauteries postes  $\leftrightarrow$  réservoirs
  - Limitation du débit des pompes de chargement à 60 m<sup>3</sup>/h
  
- Mise en conformité sismique suivant nouvel arrêté ministériel  
( étude à réaliser avant fin 2019)

RG- 0412- 8



# Bilan administratif Sécurité



## ▪ Inspection DREAL :

1 inspection DREAL a eu lieu le 26/08/15 avec 9 remarques :

- Améliorer le compte rendu de vérification annuelle de la protection foudre (fait)
- S'assurer que le personnel a connaissance en permanence du niveau de risque foudre ( équipement budgété, projet en cours)
- Clarifier la procédure de purge des camions en alerte foudre (fait)
- Indiquer le temps admissible et le temps réel de détection gaz lors de la maintenance ( au prochain contrôle)
- Comparer les probabilités de défaillance issues de l'EDD et celles de l'étude MMRI (fait)
- Lever les incohérences du rapport APAVE de contrôle des tuyauteries (fait)
- Mettre en place le système CISC proposé dans l'EDD (fait)
- Mettre à jour le tableau de suivi des tuyauteries suite au contrôle effectué par l'APAVE (fait)

## ▪ Inspection sûreté ( le 18/09/2015)

- Etablissement conforme à la réglementation existante
- Quelques pistes d'améliorations

RG- 0412-9

# Bilan administratif Sécurité



- **Etude de dangers :**

Mise à jour intégrant le projet de réduction des risques remise à l'administration et validée par APC de Mars 2014

- **PPI :**

Mise à jour en cours auprès de la Préfecture des Deux-Sèvres.

Exercice POI / PPI le 24 septembre 2015

- **PPRT :**

AP du 05/03/09 pour la prescription du PPRT

AP du 30/04/15 pour l'approbation du PPRT

RG- 0412-10



**Dépôt SIGAP OUEST de Niort**  
**Réunion CSS du 14 Mars 2016**

*Dépôt SIGAP OUEST Niort*
