

**DEPOT
BUTAGAZ DE BRIVE-LA-GAILLARDE**

**BILAN DE L'ACTIVITE A FIN DECEMBRE
2018 POUR LA COMMISSION DE SUIVI
DE SITE DU
9 AVRIL 2019**


A l'attention des membres de la C.S.S.

BRIVE-LA-GAILLARDE



1. ACTIVITE DU SITE EN 2018

L'activité industrielle du site :

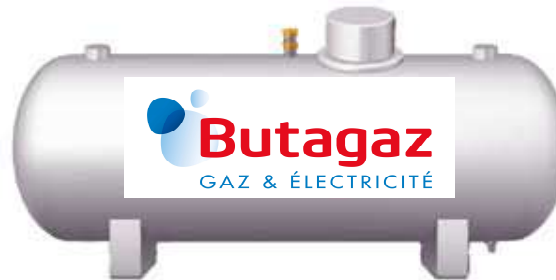

▶ Gaz en citerne

10 000 tonnes chargées
(versus 13 000 tonnes en 2017)



2. GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE

- ❖ Mise en œuvre du Plan d'Opération Interne (P.O.I.) le 27 août 2018 en raison de la rupture d'un des 2 bacs de réserve d'eau incendie (1 300 m³)
- ❖ Dans la stricte application de nos procédures, nous avons réalisé des exercices mensuels de sécurité en situation POI.

3. SUIVI DU SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE

Aucun des dysfonctionnements constaté en 2018 n'a remis en cause la sécurité du site

5 fiches d'anomalies ont été rédigées et traitées :

- **Le 26/01/2018 - Défectuosité du dispositif "Homme mort" sur vanne de purge du bout de bras (poste mixte déchargement GP/chargement PP). Mise en œuvre d'une marche équivalente :** L'opérateur BUTAGAZ vérifie, avant tout déchargement, que la vanne soit bien en position "fermé" selon les repères indiqués sur la vanne.

Vanne « Homme mort » changée le 31/01/2018

- **Le 23/07/2018 - Dérive de la détection gaz n°1 au-delà de 25 % de la LIE pendant l'exploitation du site. Mise en œuvre d'une marche équivalente :** une prise de gaz est effectuée toutes les deux heures.

Remplacement du capteur le 01/08/2018

3. SUIVI DU SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE

- **Le 28/02/2018 - Légère fuite sur soupape sphère PR2.** Isolement de la soupape et programmation d'une intervention (la 2^{ème} soupape est opérationnelle et assure la protection du réservoir (redondance)). Dispositions préalables à l'intervention : Arrêt de l'approvisionnement de PR2, vidange de PR2, contrôle de la pression basse du stockage.

Réparation de la soupape et contrôle de tarage le 04/05/2018

- **Le 17/07/2018 - Légère fissure sur le faisceau gasoil du Groupe MotoPompe A.** Mise en œuvre d'une marche équivalente : mise en position de démarrage prioritaire du Groupe Motopompe B en cas de déclenchement d'alarme et contrôle continu du Groupe Motopompe A en cas de fonctionnement.

Faisceau changé le 18/07/2018

- **Le 27/08/2018 - Rupture du bac d'eau de 1 300 m³.** Mise en œuvre d'une marche équivalente : arrêt temporaire de l'activité du site jusqu'à reconstruction, mise en place d'une bâche incendie provisoire permettant d'assurer l'autonomie en eau incendie conformément à l'Arrêté Préfectoral du 07/09/2018.

Bac reconstruit le 14/09/2018

4. IDENTIFICATION ET EVALUATION DES RISQUES MAJEURS

ARRETES PREFECTORAUX

- 15 Juin 2018 : Arrêté Préfectoral actualisant les prescriptions applicables à la société BUTAGAZ de BRIVE-LA-GAILLARDE
- 7 Septembre 2018 : Arrêté Préfectoral fixant des prescriptions d'urgence
- 26 Octobre 2018 : Arrêté Préfectoral approuvant la modification simplifiée du Plan de Prévention des Risques Technologiques de société BUTAGAZ à BRIVE-LA-GAILLARDE
- 22 Novembre 2018 : Arrêté Préfectoral abrogeant l'Arrêté Préfectoral du 7 septembre 2018 fixant des prescriptions d'urgence

5. FORMATION

Principales formations dispensées en 2018 :

Formations	Nombre de personnes formées
Spécifique Gaz	1
Communication de Crise	1
Habilitation électrique	2
Sauveteur Secouriste du Travail (SST)	3
Formation réglementaire sur le site des personnels extérieurs, nouveaux arrivants et personnels temporaires	62
Formation aux règles de circulation et aux procédures d'exploitation et d'urgence des chauffeurs (protocole sécurité)	40
Contrôle de connaissances de nos gardiens en situation de POI	3

6. GESTION DU RETOUR D'EXPERIENCE

FLASH HSSE : 14 flash nationaux diffusés en 2018 à tout le personnel du site.

En termes de mesures de prévention, études, et prises en compte de situations potentiellement dangereuses, il a été réalisé :

- 5 études de poste et de risques au travail révisées
- 3 réunions pour le personnel (communication sécurité, synthèse des résultats HSSE nationaux, etc.)
- Journée sécurité annuelle nationale le 15 novembre 2018

7. GESTION DES MODIFICATIONS

INSTALLATIONS, PROCÉDES, PRODUITS

- Analyses de risques

3 Analyses de risques ont été créées et suivies dans le cadre de la création, de la modification des installations ou des procédés

- Analyse de risques pour la mise en place de la bâche à eau provisoire de 650 m³
- Analyse de risques pour le remplacement du bac incendie
- Analyse de risques pour la gestion des niveaux des 2 réservoirs PR1 et PR2 (AP du 15 juin 2018)

- Mise en place de la télésurveillance en remplacement du gardiennage physique

8. MAITRISE DU RISQUE ET DES PROCEDES

Maîtrise du risque

Afin de garantir la sécurité dans le cadre de divers travaux et interventions d'entreprises extérieures :

- ▶ 32 plans de prévention, 45 autorisations de travail et permis associés ont été délivrés à fin décembre 2018

Maîtrise des procédés et de l'exploitation

- Réalisation de 389 contrôles périodiques
- Création et mise à jour de procédures d'entretien et de consignes spécifiques à l'établissement

9. AUDITS ET VISITES D'INSPECTION



Audit du Système de Gestion de la Sécurité

Réalisé les 11 et 12 octobre 2018 par la société AUDITRIX, organisme extérieur, 3 remarques formulées et soldées (100 %)



Inspection Technique interne

Réalisée le 15 novembre 2018 par le Coordinateur Maintenance et Expertise BUTAGAZ (maturité du système : 3,5/4)



Visite d'inspection de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL)

Réalisée le 23 janvier 2018 par Mme DELAIRE et M. ROUGET, 2 remarques et 3 demandes traitées (100 %). Celle-ci a fait l'objet d'un rapport en date du 15 février 2018 et d'un courrier de suivi BUTAGAZ en date du 30 avril 2018.
